【ドア上部】

【ドア下部】

【周りの設備】

【内側から見た図】

1, 既存開き戸を、外枠だけ残して全て撤去します。(別途工事)
2, 外枠の内側に、自動ドアフロント枠を設置します。(別途工事)
3, 新規自動ドア開閉装置、起動センサ、補助光線センサを取り付けます(自動ドア工事)

全国自動ドア産業振興会は自動ドア施工技能士等が行う自動ドア工事を寄附の対象としています。
振興会工事部分見積範囲
①両引き自動ドア開閉装置
②内外起動センサ(無目付けセンサ)、補助光線センサ
③上記材料取付調整一式

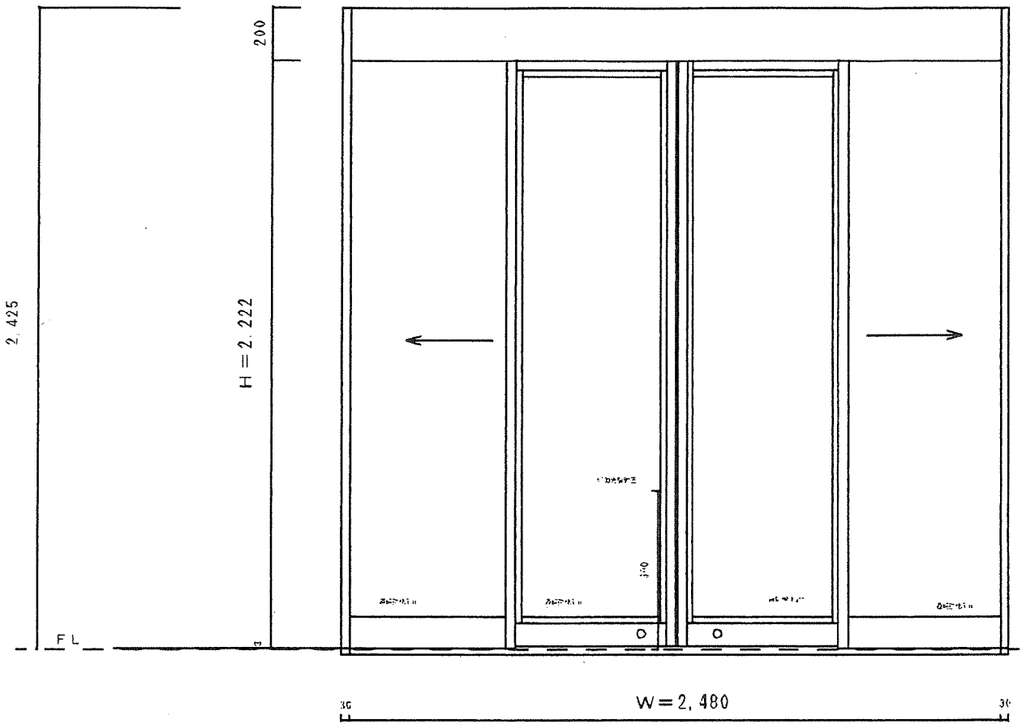

仕様番号	AD-1	改定履歴	
使用数量	1	カラー記号	本体：HL・シルバー
		表面仕上	HL
方開き勝手	室内側 ○ 室外側	ガラス	透明フロート3+3mm合わせガラス
吊元	左 ○ 右	ハンドル	デスティニー-H

番号	名称・記号	数量
材質	製作 D シリーズ用 ホ	1組

変更履歴		設計監督	殿	工事名	南方市役所 工事	承認	担当	作成	検図	作成日	図番
		設計	殿	図面名称	AD－1姿図						1

YKK AP



外部

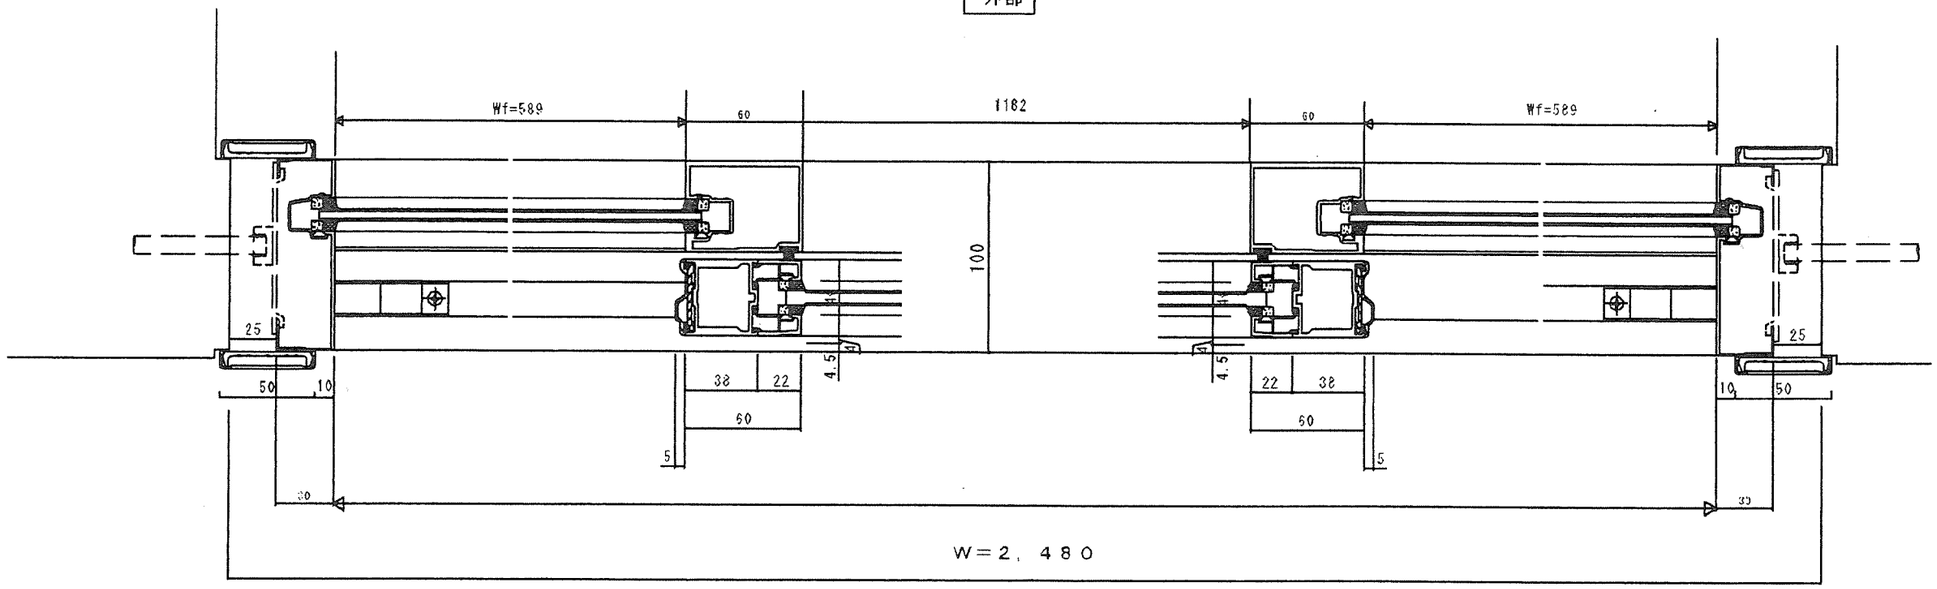

内部

変更記号	設計監理 殿	工事名 直方市役所 工事	設計	担当	作図	尺度	御承認印	図番 2
	施工 殿	図面内容 AD－1横断面図					千 月 日	通し図番

1 AD

YKK AP

内部

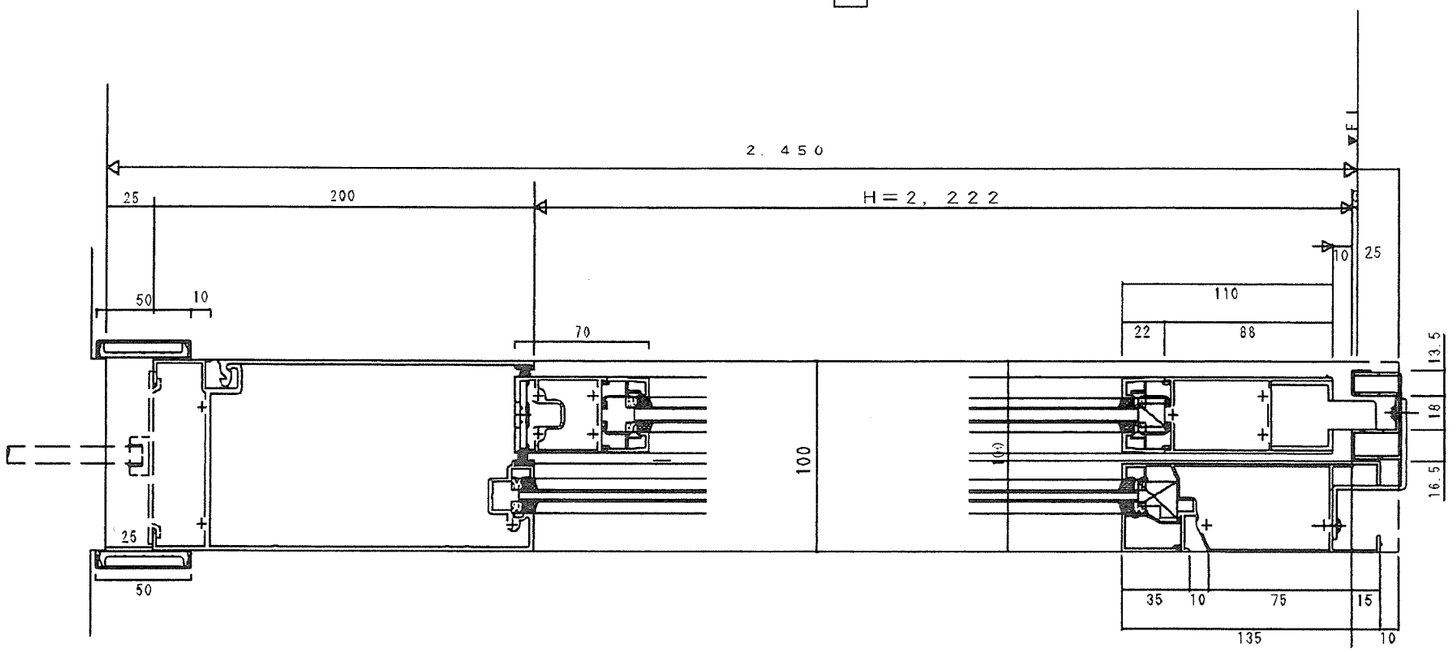

外部

1
AD

変更記事	設計監理 殿	工事名 直方市役所 工事	所長	担当	作図	尺度	関係花印	図番 3
	施工 殿	図面内容 AD－1縦断面図					年月日	通し図番

YKK ap

NPO法人全国自動ドア産業振興会

2024年度活動　福祉施設利用者の為の自動ドア設置事業　No. 5

福岡県直方市殿町7番1号
直方市庁舎 様

庁舎内を改修して、来庁される方々が多目的に利用できるようなスペースを設けることを計画していましたが、既存開き戸の為、車椅子利用者、障がい者、子ども連れの方などには開閉が困難なことが懸念されていました。

2024年12月18日　全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

①施工前の様子（外観）

②サッシ図作成



③自動ドア用サッシ

④サッシ内部の様子

⑤新規自動ドア開閉装置

⑥新規自動ドア装置取付

⑦自動ドア装置取付

⑧内外センサ

⑨自動ドア工事完了

〒165－0031　NPO法人全国自動ドア産業振興会
東京都中野区上鷺宮3-16-5日本自動ドア株式会社2号館3階
TEL　03-3998-3077　FAX　03-3998-3121
E-mail jadsa@jadsa.or.jp　　URL https://www.jadsa.or.jp
